


EXTENSION DE LA LIGNE FERROVIÈRE REMAUFENS-BOSSONNENS-PALÉZIEUX

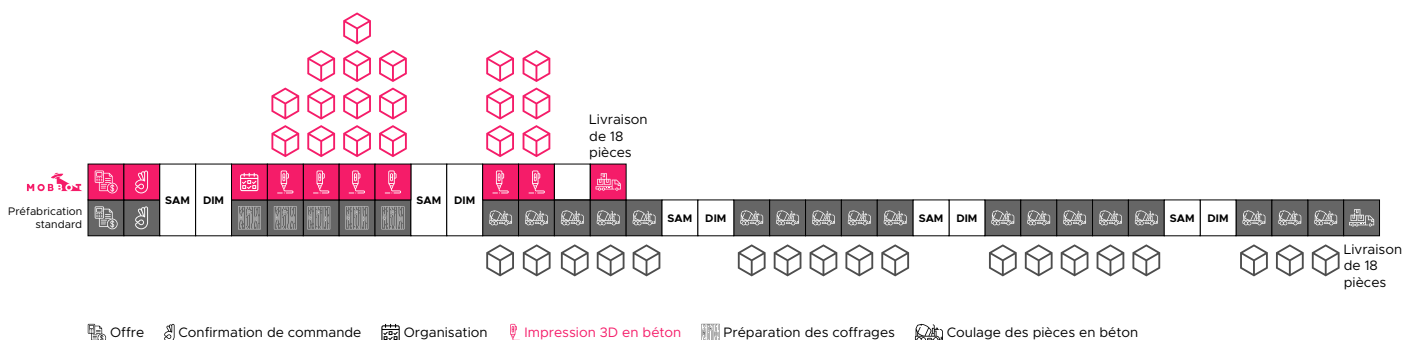

CONTEXTE

Au milieu de l'été 2019, l'exécution du chantier doit être replanifiée car 20 chambres sont manquantes dans le contrat.

Ces éléments préfabriqués étaient en rupture de stock, et ne pouvaient pas être coulés sur place par manque de ressources humaines.

PROBLÈME

Il y a un besoin urgent de 29 chambres, qui ne peuvent pas être fournies par TPF pour les raisons suivantes :

- pas de chambres en stock
- en pleine période des pics d'activités
- changement dans l'exécution du chantier





FLEXIBILITÉ
entièrement personnalisé
au jour le jour



TIME SAVING
efficacité des ressources
livrable sous 9 jours



SOLUTION

Le 10 juillet, Grisoni Zaugg demande une offre de 3 types différents pour une douzaine de chambres livrées le 25 juillet. Le chef des infrastructures TPF valide la qualité de la chambre d'essai.

Le 12 juillet, 18 chambres sont signées, et un quatrième type est créé selon les besoins.

Le 16 juillet, la production des chambres commence.

L'imprimante 3D de béton Mobbot permet une grande flexibilité, Grisoni Zaugg peut modifier la commande au jour le jour sans interférer sur la date de livraison.

9 jours ouvrables plus tard, 18 chambres personnalisées sont livrées et installées sur le site.

Suite au succès, Grisoni Zaugg en commande 11 de plus.



CONTACTS

Superviseur du site:



Chef de projet:



VIDÉO

